




Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde

Was passiert?

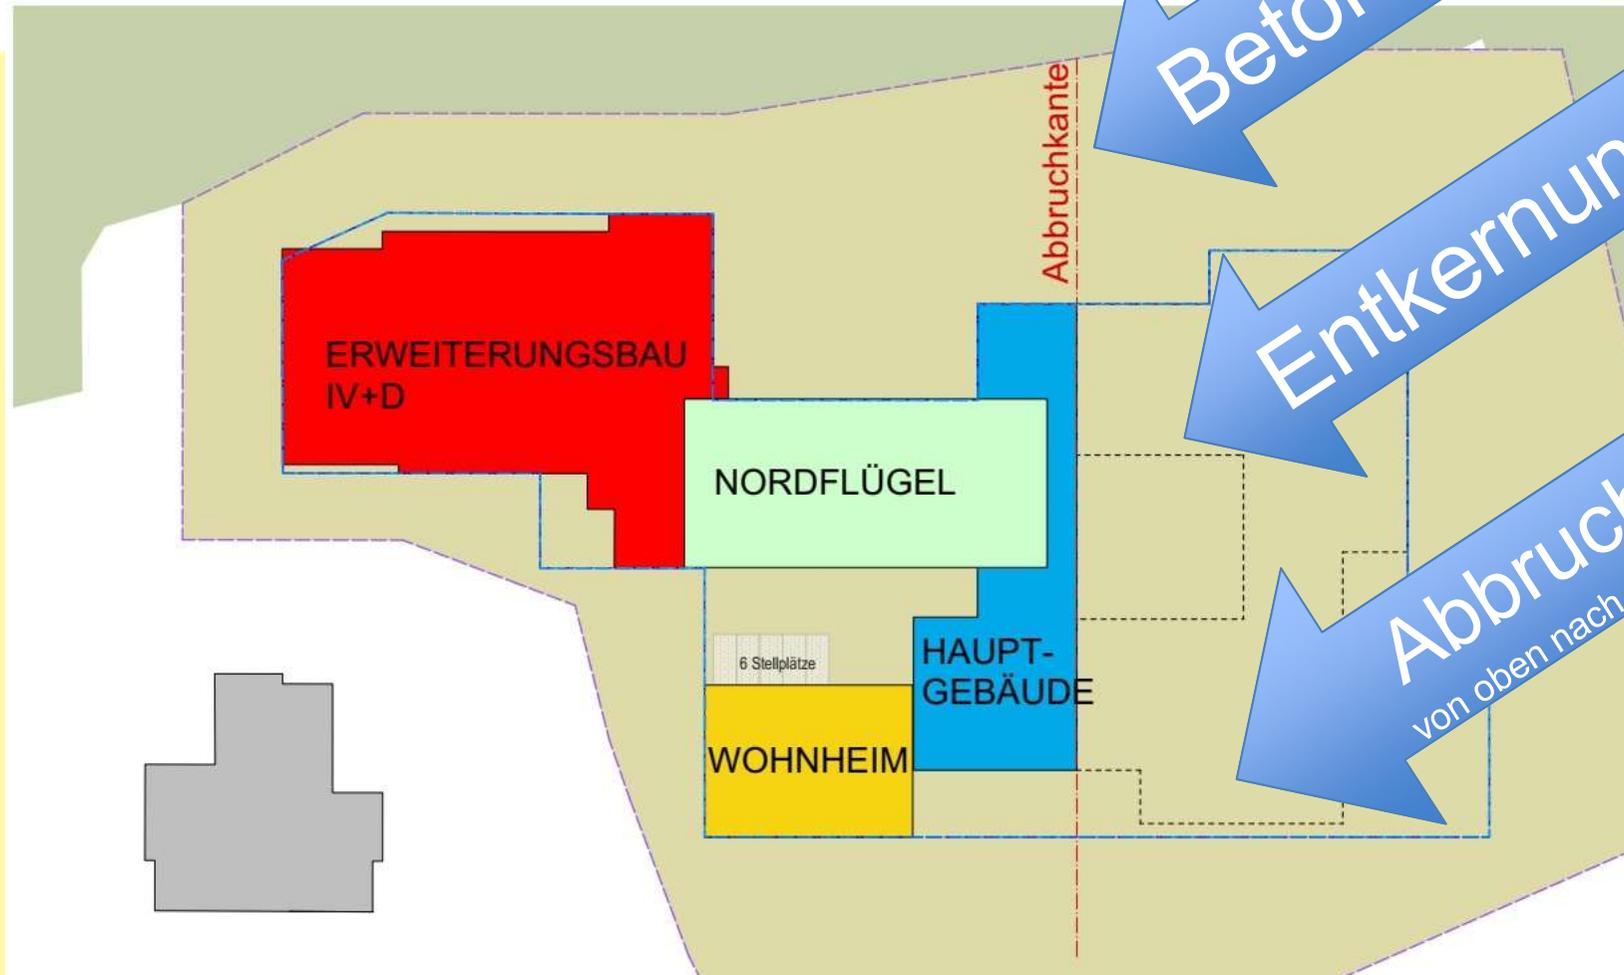

Betrongsägen

Entkernung


Abbruch
von oben nach unten



Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde Was passiert?

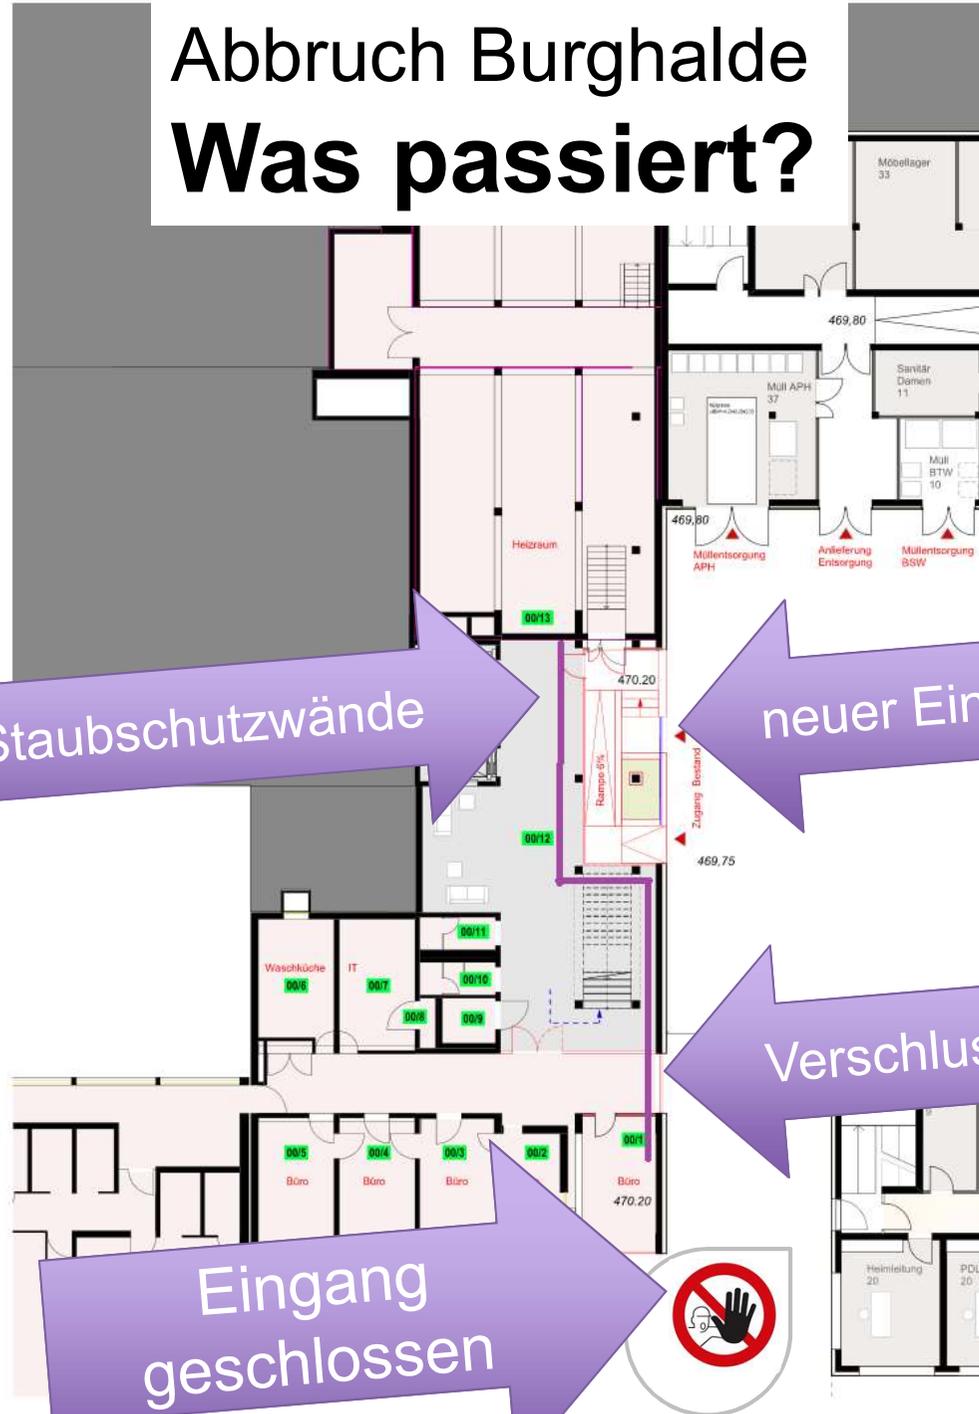




Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde

Was passiert?

Gruppe/ 15 Pl

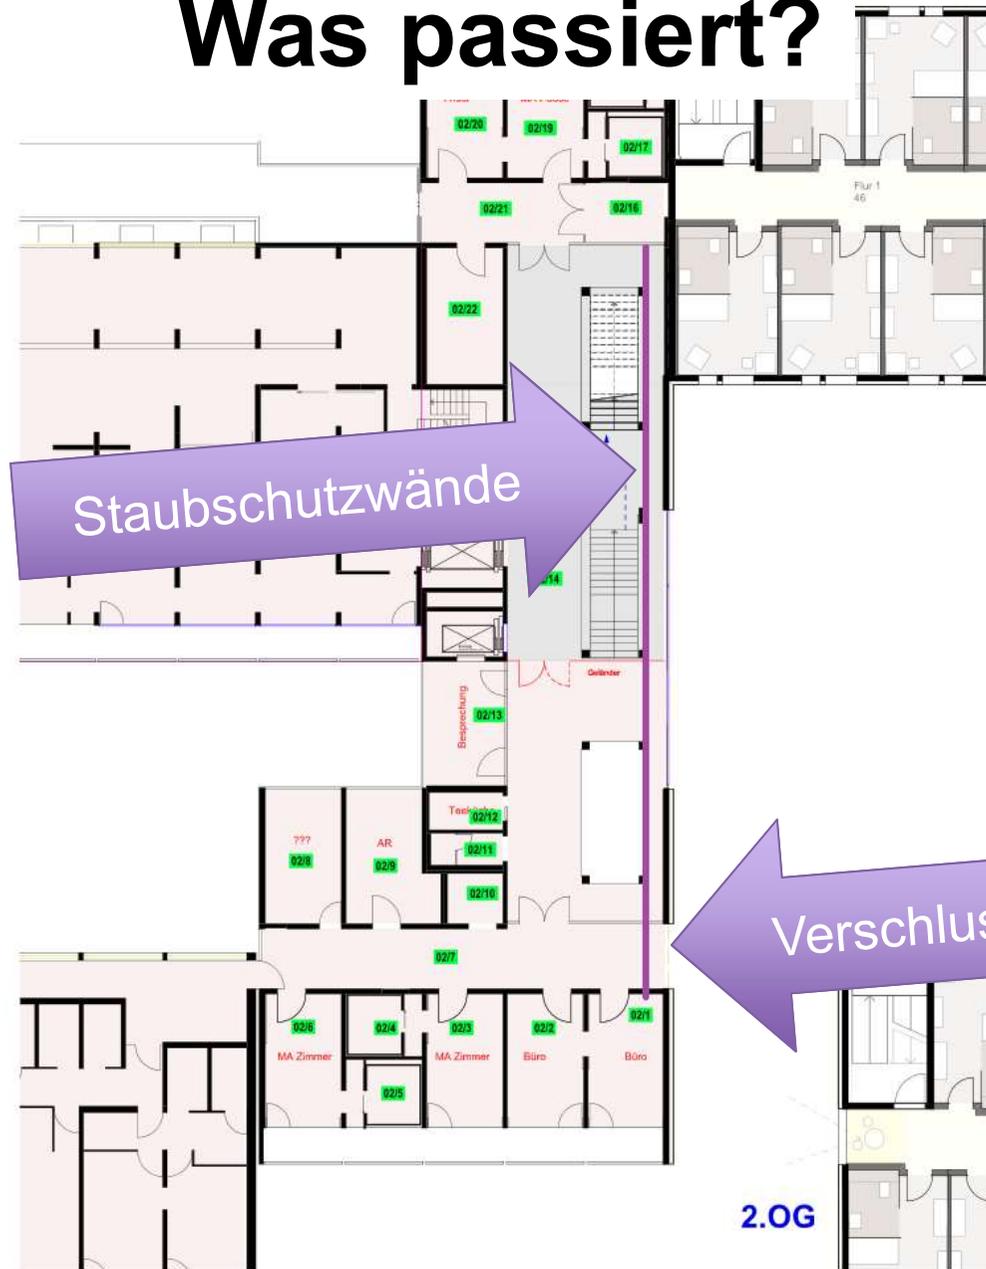

Staubschutzwände

Verschluss Fassade

2.OG



Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde

Was passiert?






Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde

Was passiert?

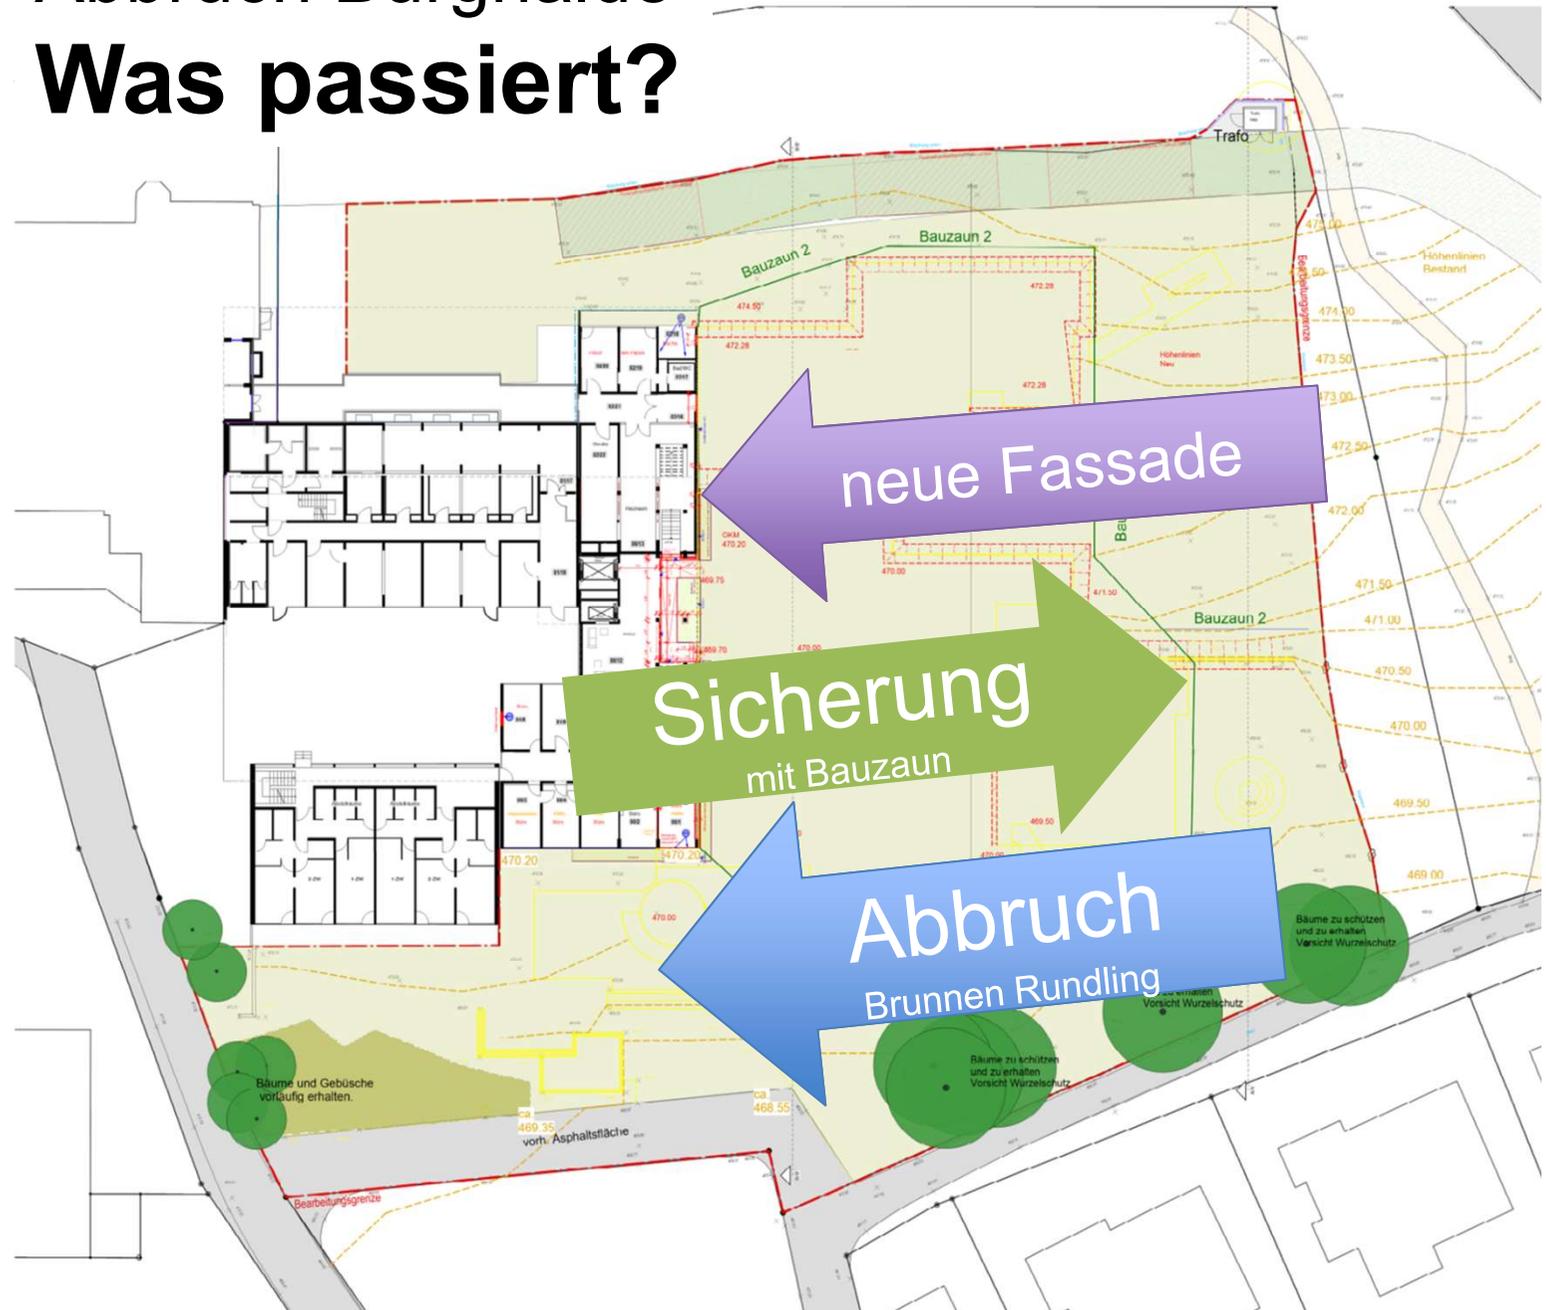



Evangelischer
Diakonieverein
Sindelfingen e.V.

Leben in Geborgenheit.

Abbruch Burghalde

Zeitplan – wann wird's laut?



Sägearbeiten 2 Wochen –
vom 27.11. bis 08.12.23

Rahmenterminplan													Seite 1 von 1	
Projektnummer: 15066			2023						2024					
			4. Quart.			1. Quart.			2. Quart.			3. Quart.		
Vorgang	Start	Ende	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
Planung LP 1-4	Mo, 30.05.22	Fr, 25.08.23												
Planung LP 5-7 Abbruch, Vorber. Maßnahmen	Mo, 27.02.23	Fr, 22.09.23												
Planung LP 5-7 Neubau	Mo, 27.02.23	Fr, 30.08.24												
Ausführung Schnittstelle / Abbruch	Do, 12.10.23	Fr, 14.06.24	Ausführung Schnittstelle / Abbruch											
Sitzung Aufsichtsrat - Entscheidung Abbruch	Do, 12.10.23	Do, 12.10.23	◆ Sitzung Aufsichtsrat - Entscheidung Abbruch											
Elektro - Rückbau Bestand	Mo, 16.10.23	Fr, 10.11.23	■ Elektro - Rückbau Bestand											
Abbruch Bestandsgebäude - Entkernung	Mo, 13.11.23	Fr, 22.12.23	■ Abbruch Bestandsgebäude - Entkernung											
Abbruch Bestandsgebäude - Sägearbeiten	Mo, 11.12.23	Fr, 22.12.23	■ Abbruch Bestandsgebäude - Sägearbeiten											
Abbruch Bestandsgebäude - Baggerarbeiten	Mo, 08.01.24	Fr, 16.02.24	■ Abbruch Bestandsgebäude - Baggerarbeiten											
Rohbauarbeiten - Fa. Rommel	Mo, 06.11.23	Fr, 02.02.24	■ Rohbauarbeiten - Fa. Rommel											
Dachdichtung - Dachaufbau an Schnittstelle trennen	Mo, 22.01.24	Fr, 02.02.24	■ Dachdichtung - Dachaufbau an Schnittstelle trennen...											
Zimmerarbeiten - DG neue Attika, Wand 3.OG ertüchtigen	Mo, 05.02.24	Fr, 16.02.24	■ Zimmerarbeiten - DG neue Attika, Wand 3.OG ertüchtigen...											
Kunststofffenster	Mo, 19.02.24	Fr, 08.03.24	■ Kunststofffenster											
Alu-Glas Fassade EG	Mo, 19.02.24	Fr, 08.03.24	■ Alu-Glas Fassade EG											
Putz / Maler Aussen - Fassade	Mo, 11.03.24	Fr, 03.05.24	■ Putz / Maler Aussen - Fassade											
Flaschner - Attika	Mo, 19.02.24	Fr, 23.02.24	■ Flaschner - Attika											
Putz / Maler Innen - Bestand ergänzen	Mo, 11.03.24	Fr, 05.04.24	■ Putz / Maler Innen - Bestand ergänzen											
Bodenbelag - Bestand ergänzen	Mo, 08.04.24	Fr, 26.04.24	■ Bodenbelag - Bestand ergänzen											
Aussenanlagen	Mo, 06.05.24	Fr, 14.05.24	■ Aussenanlagen											



Baggerarbeiten
im EG
